

JERZY WÓJCIK

MINISTERSTWO BUDOWNICTWA
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Zarządzenie nr 24

Ministra Budownictwa
i Przemysłu Materiałów Budowlanych
z dnia 30 lipca 1977 r.

**w sprawie szczegółowych zasad
oraz trybu bilansowania i zlecenia
robót budowlano – montażowych
na 1978 r.**

Warszawa, sierpień 1977

Druk: Zakład Poligrafii Centralnego Ośrodka Informacji Budownictwa
Warszawa, ul. Instalatorów 7 c

Warszawa 1977. Nakład 7600 + 20 egz. Format A5.

Ark. druk. 3,0. Ark. wyd. 2,73. Papier offset. kl. V/70 g.

Druk z materiałów gotowych do reprodukcji ukończono 13 VIII 77 r. Zam. 512/77.

MINISTERSTWO BUDOWNICTWA
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Zarządzenie nr 24

Ministra Budownictwa
i Przemysłu Materiałów Budowlanych
z dnia 30 lipca 1977 r.

**w sprawie szczegółowych zasad
oraz trybu bilansowania i zlecenia
robót budowlano – montażowych
na 1978 r.**

Warszawa, sierpień 1977

Druk: Zakład Poligrafii Centralnego Ośrodka Informacji Budownictwa
Warszawa, ul. Instalatorów 7 c

Warszawa 1977. Nakład 7600 + 20 egz. Format A5.

Ark. druk. 3,0. Ark. wyd. 2,73. Papier offset, kl. V/70 g.

Druk z materiałów gotowych do reprodukcji ukończono 13 VIII 77 r. Zam. 512/77.

ZARZADZENIE Nr 24

MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 30 lipca 1977 r.

w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu bilansowania i zlecenia robót budowlano-montażowych na 1978 r.

PL-4/Og/90/77

W związku z § 10 Uchwały Nr 95/77 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1977r. w sprawie trybu i terminów opracowania projektu narodowego planu społeczno-gospodarczego i budżetu Państwa na 1978 r. zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Bilans robót budowlano-montażowych obejmuje nakłady w kontynuowanych i nowo rozpoczynanych w 1978 r. zadaniach inwestycyjnych realizowanych w systemie zleceniowym i gospodarczym oraz roboty spoza planu inwestycyjnego realizowane w systemie zleceniowym.
2. Roboty budowlano-montażowe związane z realizacją zadań inwestycyjnych powinny być dostosowane w bilansie robót i portfelach zleceń do wielkości wynikających z wytycznych zatwierdzonych uchwałą Nr 94/77 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1977 r. w sprawie opracowania projektów resortowych i wojewódzkich planów na 1978 rok oraz dodatkowych ustaleń w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w odniesieniu do inwestycji kontynuowanych:
 - podlegających zakończeniu w 1978 r. i w I kwartale 1979 r.,
 - nie podlegających zakończeniu w 1978 r. i w I kwartale 1979 r.,
 - dla których zakłada się ograniczenie robót lub wstrzymanie ich realizacji w 1978 r.oraz inwestycji przewidzianych do rozpoczęcia w 1978 r.

§ 2

1. Zlecenie robót budowlano-montażowych dotyczy zadań inwestycyjnych nowo rozpoczynanych w 1978 roku oraz robót spoza planu inwestycyjnego.

2. Roboty budowlano-montażowe dotyczące zadań inwestycyjnych nowo rozpoczynanych mogą być zlecane tylko do wysokości nie zaangażowanych nakładów w inwestycjach kontynuowanych w 1978 r. oraz po zachowaniu rezerwy obejmującej nakłady na roboty poślizgowe w wysokości około 5%.
3. Zlecenie robót budowlano-montażowych może dotyczyć wyłącznie zadań inwestycyjnych posiadających zatwierdzone do dnia 30 września 1977 r. założenia techniczno-ekonomiczne lub dokumentację uproszczoną w terminach uzgodnionych między stronami, zapewnienie dostarczenia projektu technicznego w terminach i zakresie umożliwiającym sprawną realizację inwestycji oraz zabezpieczone dostawy maszyn, urządzeń i konstrukcji stalowych z dostaw krajowych lub z importu. Zadania nie posiadające zatwierdzonych w tym terminie założeń techniczno-ekonomicznych mogą być zlecane jedynie w przypadkach, gdy późniejsze terminy ich zatwierdzenia wynikają z odpowiednich decyzji rządowych.
4. W toku zlecania robót budowlano-montażowych w nowo rozpoczynanych w 1978 r. zadaniach inwestycyjnych należy zapewnić odpowiednią koncentrację nakładów w pierwszym roku realizacji w celu stworzenia warunków dla ich wykonania w terminach uwzględniających obowiązujące cykle realizacji.

§ 3

1. Ministerstwa urzędy centralne /, urzędy wojewódzkie i centralne związki spółdzielcze zapewnia pełne zagospodarowanie potencjału wykonawczego własnych jednostek działających w systemie gospodarczym i przedsiębiorstw budowlano-montażowych, w szczególności do realizacji inwestycji modernizacyjnych. Przedsiębiorstwom resortu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych mogą być zlecane roboty po pełnym wykorzystaniu przez zainteresowane resorty i urzędy wojewódzkie mocy wykonawczej własnych jednostek wykonawczych.

2. Inwestycje realizowane w ramach czynów społecznych nie mogą angażować mocy wykonawczej przedsiębiorstw budowlano-montażowych.
3. Roboty budowlano-montażowe dotyczące nowo rozpoczynanych w 1978 r. inwestycji mogą być przyjmowane do wykonawstwa do wysokości ustalonych dla wykonawców zadań produkcyjnych, pomniejszonych o rezerwę na roboty poślizgowe w wysokości 5%.
4. Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe mogą przyjmować zlecenia na roboty spoza planu inwestycyjnego do wysokości ustalonej na ten cel wielkości zadań produkcyjnych.

§ 4

1. Inwestorzy planu centralnego, terenowego i centralnych związków spółdzielczych w okresie od 5 do 25 sierpnia 1977 r. uzgodnią z generalnymi /częściowymi/ wykonawcami zakres rzeczowo-wartościowy i terminy realizacji w 1978 r. inwestycji kontynuowanych i nowo rozpoczynanych realizowanych lub przewidzianych do realizacji przez przedsiębiorstwa resortu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych oraz przez inne przedsiębiorstwa wykonawcze spoza resortu inwestorskiego, sporządzając protokoły wg wzorów podanych w załączniku do zarządzenia, z uwzględnieniem ustaleń, o których mowa w § 1 ust. 2 oraz danych zawartych w "Charakterystykach realizacyjnych inwestycji w latach 1977-1978" wprowadzonych pismem okólnym Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 czerwca 1977 r.
Uzgodnienia nie obejmują inwestycji realizowanych systemem gospodarczym i przez przedsiębiorstwa budowlano-montażowe resortu inwestorskiego.
2. Protokoły, o których mowa w ust. 1 inwestorzy przekażą niezwłocznie nadzorującym ich ministerstwu /urzędowi centralnym/ - urzędowi wojewódzkim - centralnym związkowi spółdzielczym.

Zjednoczenia nadzorujące przedsiębiorstwa budowlano-montażowe w resorcie budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych przekażą Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w terminie do 15 sierpnia 1977 r. opinię o możliwości zapewnienia wykonawstwa zadań inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust.2 realizowanych i przewidzianych do realizacji własnym potencjałem wykonawczym.

§ 5

Ministerstwa /urzędy centralne/, urzędy wojewódzkie i centralne związki śdzielcze przekażą w terminie do 30 sierpnia 1977 r. Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych:

rozliczenie nakładów inwestycyjnych w 1978 r. wraz z protokołami uzgodnień, o których mowa w § 4,

rozliczenie zaangażowania potencjału wykonawczego własnych przedsiębiorstw budowlano-montażowych,

imiennie wykazy inwestycji realizowanych:

- systemem gospodarczym,
- przez własne przedsiębiorstwa budowlano-montażowe,

wliczone w ramach nakładów inwestycyjnych i zadań produkcyjnych budownictwa ustalonych dla poszczególnych resortów /urzędów wojewódzkich/ wyciecznych zatwierdzonych uchwałą Nr 94/77 Rady Ministrów z dnia lipca 1977 r.

§ 6

Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe są obowiązane zapewnić w pierwszej kolejności wykonawstwo dla inwestycji:

związanych z gospodarką żywnościową,

objętych programem budownictwa mieszkaniowego, łącznie z budownictwem podstawowych urządzeń towarzyszących i uzbrojeniem terenu,

- 3/ związanych z produkcją rynkową i eksportową,
- 4/ objętych kompleksem surowcowo-energetycznym oraz inwestycji szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej.

§ 7

1. Inwestorzy planu centralnego, planu terenowego i centralnych związków spółdzielczych w terminie 5 dni od podjęcia decyzji o wprowadzeniu zadań do planu inwestycji i planu budownictwa, zlecą właściwym wykonawcom roboty budowlano-montażowe w nowo rozpoczynanych w 1978 r. zadaniach inwestycyjnych.
2. Inwestorzy planu centralnego przy zlecaniu robót budowlano-montażowych w zakładowym budownictwie mieszkaniowym, powinni przedstawić decyzję właściwych władz terenowych o objęciu tych zadań wojewódzkim programem budownictwa mieszkaniowego w 1978 r.

§ 8

1. Generalni wykonawcy udzielą sukcesywnie podwykonawcom robót, w terminie 10 dni po podpisaniu protokółów uzgodnień z inwestorami, zleceń na roboty budowlano-montażowe związanych z realizacją kontynuowanych i nowo rozpoczynanych inwestycji, a podwykonawcy potwierdzą przyjęcie zleceń w terminie 5 dni od daty otrzymania zlecenia.
2. W wyniku podjętych decyzji, o których mowa w § 7 generalni wykonawcy zweryfikują zlecenia udzielone podwykonawcom robót w terminie 10 dni od daty podjęcia tych decyzji.

§ 9

Portfele zleceń wykonawców robót budowlano-montażowych na 1978 r. zatwierdzą w terminie 30 dni od podjęcia decyzji, o których mowa w § 7 dyrektorzy zjednoczeń budownictwa / jednostek równorzędnych/.

§ 10

Zjednoczenia /jednostki równorzędne/ nadzorujące przedsiębiorstwa budowlano-montażowe są zobowiązane do prowadzenia ciągłego rachunku zaangażowania nakładów i potencjału wykonawczego nadzorowanych przedsiębiorstw, a ponadto zjednoczenia wiodące w regionalnej koordynacji międzybranżowej budownictwa do prowadzenia ciągłego rachunku zaangażowania nakładów i potencjału wykonawczego w skali województw w zakresie inwestycji planu tere-
nowego.

§ 11

1. Bilans robót budowlano-montażowych sporządza się przy zastosowaniu elektronicznej techniki obliczeniowej.
2. Dyrektorowi Centrum Informatyki Przemysłu Budowlanego "ETOB" powierza się koordynację w zakresie zbierania, przetwarzania i uzupełniania danych dotyczących bilansu robót budowlano-montażowych.
3. Dyrektor Centrum Informatyki Przemysłu Budowlanego "ETOB" zapewni niezbędne środki techniczne umożliwiające ciągłe aktualizowanie zbioru informacji w zakresie bilansowania robót budowlano-montażowych.
4. Koszty związane z prowadzeniem ciągłego rachunku zaangażowania nakładów i mocy wykonawczej będą pokrywane z budżetu Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
5. Dyrektor Centrum Informatyki Przemysłu Budowlanego "ETOB" zapewni okresowe informacje dotyczące bilansu robót dla Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, zjednoczeń nadzorujących przedsiębiorstwa budowlano-montażowe resortu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych, zjednoczeń wiodących w regionalnej koordynacji międzybranżowej budownictwa oraz Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Centrali Narodowego Banku Polskiego.

Inne jednostki mogą korzystać ze zbioru informacji według indywidualnych zamówień na zasadach odpłatności ustalonych przez Dyrektora Centrum Informatyki Przemysłu Budowlanego "ETOB".

§ 12

Ministerstwa /urzędy centralne/, urzędy wojewódzkie oraz centralne związki spółdzielcze dokonają aktualizacji jednostek odpowiedzialnych za zbieranie z przedsiębiorstw budowlano-montażowych własnego resortu, kompletowanie i przekazywanie kart zadań inwestycyjnych i kart zadań produkcyjnych i poinformują o tym, w terminie do 20 sierpnia 1977 r. Centrum Informatyki Przemysłu Budowlanego ETOB - Zespół Centralnej Obsługi Systemu "AWIZO-MOC" w Warszawie.

§ 13


Ustala się wytyczne w sprawie bilansowania i zlecenia robót budowlano-montażowych na 1978 rok stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER

W porozumieniu:


Pracowni Instytutu Inżynierskiego
Burmistrz Miasteczka przy ul. Mickiej 10

mgr inż. Andrzej Wirowski



W Y T Y C Z N E

w sprawie bilansowania i zlecenia robót budowlano-montażowych na 1978 r.

1. Szczegółowy zakres i tryb prac inwestorów i wykonawców robót budowlano-montażowych.
1. Zakres i układ informacji związanych ze zlecaniem, przyjmowaniem do wykonawstwa i bilansowaniem robót budowlano-montażowych w 1978 r. określają:
 - rozliczenie nakładów inwestycyjnych opracowane według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wytycznych,
 - protokół uzgodnienia zakresu robót budowlano-montażowych inwestycji kontynuowanych; opracowany według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do wytycznych,
 - wstępna propozycja zapewnienia wykonawstwa dla nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych opracowana według wzoru stanowiącego załącznik Nr do wytycznych,
 - protokół uzgodnienia zakresu rzeczowego i wartości robót budowlano-montażowych w spółdzielczym budownictwie mieszkaniowym, opracowany według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4,
 - zaangażowanie potencjału wykonawczego własnych przedsiębiorstw budowlano-montażowych opracowane według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do wytycznych,
 - imienny wykaz inwestycji realizowanych systemem gospodarczym i przez własne przedsiębiorstwa budowlano-montażowe resortów inwestorskich i urzędów wojewódzkich - Związków Spółdzielczych, opracowane według wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do wytycznych,
 - karta zadania inwestycyjnego oznaczona symbolem K1, opracowana według wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do wytycznych,

- karta zadania inwestycyjnego oznaczona symbolem KG opracowana według wzoru stanowiącego załącznik Nr 8,
 - karta aktualizacji informacji o zadaniu inwestycyjnym oznaczona symbolem KA, opracowana według wzoru stanowiącego załącznik Nr 9 do wytycznych,
 - karta zadań produkcyjnych oznaczona symbolem KM, opracowana według wzoru stanowiącego załącznik Nr 10 do wytycznych.
2. Ministerstwa /urzędy centralne/, urzędy wojewódzkie i centralne związki spółdzielcze przekazują w terminie do 30 sierpnia 1977 r. do Departamentu Planowania Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych:
- 1/ 2 egzemplarze rozliczenia nakładów inwestycyjnych według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do wytycznych,
 - 2/ 1 egzemplarz protokołów uzgodnień zakresu rzeczowo-wartościowego i terminów realizacji kontynuowanych i nowo rozpoczynanych w 1978 r. zadań inwestycyjnych, według wzorów stanowiących załączniki Nr 2,3,4,
 - 3/ 2 egzemplarze zaangażowania potencjału wykonawczego własnych przedsiębiorstw budowlano-montażowych, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do wytycznych,
 - 4/ 1 egzemplarz imiennego wykazu inwestycji realizowanych systemem gospodarczym i oddzielnie przez własne przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do wytycznych. Odpowiednie informacje w zakresie spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego i w tym samym terminie przekazuje Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Departamentowi Planowania Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

3. Zjednoczenia budownictwa przekażą Departamentowi Planowania Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 2 egzemplarze opinii, o których mowa w § 4 ust.3 w terminie do 15 sierpnia 1977 r. w układzie wzoru stanowiącego załącznik Nr 11
4. Wstępne propozycje zapewnienia wykonawstwa i protokoły uzgodnienia zakresu robót budowlano-montażowych oraz protokoły uzgodnienia zakresu rzeczowego i robót budowlano-montażowych w spółdzielczym budownictwie mieszkaniowym, stanowią podstawę do prac nad bilansem robót budowlano-montażowych na 1978 r. i ustalenia przez organa centralne nakładów i wykonawstwa dla poszczególnych zadań inwestycyjnych.
5. Zakres robót budowlano-montażowych w nowo rozpoczynanych w 1978 r. zadaniach inwestycyjnych jako wstępne propozycje zapewnienia wykonawstwa i zakres robót w kontynuowanych zadaniach inwestycyjnych oraz terminy realizacji robót ustalają inwestorzy bezpośredni /zastępczy/z generalnymi /częściowymi/ wykonawcami przy udziale zjednoczeń nadzorujących inwestora i wykonawcę, według wzorów protokołów podanych w załącznikach do wytycznych.
Zakres rzeczowy i wartościowy robót budowlano-montażowych w spółdzielczym budownictwie mieszkaniowym uzgadniają spółdzielnie budownictwa mieszkaniowego z generalnymi bezpośrednimi wykonawcami robót, przy udziale wojewódzkich związków spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i zjednoczeń budownictwa nadzorujących generalnych/bezpośrednich/ wykonawców.
Terminy uzgodnień skoordynują zjednoczenia inwestora, wojewódzkie związki spółdzielcze w uzgodnieniu z zainteresowanymi zjednoczeniami budownictwa.
6. Inwestorzy w terminie 5 dni od podjęcia decyzji o których mowa w § 7 zarządzenia zleca właściwym wykonawcom roboty w nowo rozpoczynanych inwestycjach na kartach zadań inwestycyjnych K1 wypełniając je w 3 jedno-brzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze przekazują wykonawcom
7. Karta zadania inwestycyjnego K1 wypełniona przez inwestora, stanowi dla wykonawcy zlecenie na wykonanie robót budowlano-montażowych.

Dla inwestycji zakwalifikowanych do wykonawstwa według zasad, o których mowa w § 7 zarządzenia generalnej /częściowej/ wykonawca na podstawie uzgodnień dokonanych z inwestorami i głównymi podwykonawcami robót wypełnią kartę KG.

W przypadku, gdy obok generalnego realizatora inwestycji występuje generalny wykonawca - kartę zadania inwestycyjnego KG wypełnia generalny wykonawca. Jeżeli nie występuje na zadaniu generalny wykonawca - karty wypełniają wszyscy częściowi wykonawcy w porozumieniu z generalnym realizatorem inwestycji.

Wykonawcy robót budowlano-montażowych nie wypełniają kart zadań inwestycyjnych KG dla inwestycji nie przyjętych do wykonawstwa.

8. 1/ Inwestorzy wypełniają protokoły uzgodnień zakresu robót budowlano-montażowych dla inwestycji kontynuowanych i nowo rozpoczynanych w 1978 r. w 6-ciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których przekazuje:
 - 1 egz. generalnemu /bezpośredniemu/ wykonawcy,
 - 1 egz. jednostce nadzorującej generalnego/bezpośredniego/ wykonawcę
 - 1 egz. własnej jednostce nadrzędnej,
 - 2 egz. własnemu Ministerstwu - Urzędowi Wojewódzkiemu - centralnemu związkowi, za pośrednictwem własnej jednostki nadrzędnej.
- 2/ Postanowienia zawarte w pkt 1/ odnoszą się także do spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego.
9. Przedsiębiorstwa budowlano-montażowe wypełniają kraty zadań inwestycyjnych KG dla inwestycji zakwalifikowanych do wykonawstwa w 6 jednobrzmiących egzemplarzach w terminie 15 dni od podjęcia decyzji o zapewnieniu wykonawstwa /§ 7 zarządzenia/ przekażą:
 - 1/ 2 egzemplarze /w tym oryginal/ nadzorującym je zjednoczonym /jednostkom równorzędnym/ lub jednostkom odrębnie wyznaczonym przez własne ministerstwa /§ 13 - zarządzenia/ łącznie z 1 egzemplarzem K1

- 2/ 1 egzemplarz właściwym ze względu na lokalizację inwestycji zjednoczeniom wiodącym w regionalnej koordynacji międzybranżowej budownictwa, wymienionym w załączniku nr 12 do wytycznych.
10. Zjednoczenie nadzorujące przedsiębiorstwa budowlano-montażowe lub jednostki wyznaczone, po skompletowaniu i dokonaniu merytorycznej i formalnej oceny danych zawartych w kartach przekażą w terminie 20 dni od podjęcia decyzji centralnych, o których mowa w § 7, 1 egzemplarz /oryginal/ kart zadań inwestycyjnych KI i KG do Centrum Informatyki Przemysłu Budowlanego "ETOB" - Zespołu Centralnej Obsługi Systemu "Awizo-Moc" w Warszawie ul. Wspólna 2 pokój Nr 8.
11. Karty zadań produkcyjnych /KM/ wypełniają w układzie wojewódzkim wszystkie przedsiębiorstwa budowlano-montażowe i przekazują:
- 1/ 1 egzemplarz /oryginal/ do Centrum Informatyki Przemysłu Budowlanego "ETOB" - Zespołu Centralnej Obsługi Systemu "Awizo-Moc" w Warszawie za pośrednictwem nadzorującego /lub wyznaczonego/ zjednoczenia /jednostki równorzędnej/,
- 2/ 1 egzemplarz własnej jednostce nadrzędnej,
- 3/ po jednym egzemplarzu zjednoczeniom wiodącym w regionalnej koordynacji branżowej budownictwa, na terenie których będą prowadzone w 1977 roku przez wykonawcę robot budowlano-montażowe.
- Karty te należy przekazywać w terminach analogicznych jak karty zadań inwestycyjnych.
12. Wszelkie zmiany w informacji o zadaniach inwestycyjnych i o zadaniach produkcyjnych przedsiębiorstw budowlano-montażowych powinny być bieżąco wprowadzane do kart "KA" i "KM" i w ciągu 7 dni po zaistnieniu zmian, zjednoczenia przekazują zaktualizowane karty do Centrum Informatyki Przemysłu Budowlanego "ETOB" - Zespołu Centralnej Obsługi Systemu "Awiz-Moc" w Warszawie.
- W przypadku wprowadzenia do realizacji w ciągu 1978 r. nowych zadań inwestycyjnych inwestorzy wypełniają karty KI a przedsiębiorstwa wykonawcze karty KG. Zjednoczenie nadzoruj^{ce}-wykonawców,

przekazują te karty w ciągu 7 dni do Zespołu Centralnej Obsługi Systemu "Awizo-Moc".

13. Nie sporządza się kart dla robót spoza planu inwestycyjnego i robót wykonywanych systemem gospodarczym.
14. Karty zadań dla inwestycji planu "S" przekazywane są według zasad określonych w odrębnym trybie.
15. Wykaz zjednoczeń wiodących w regionalnej koordynacji branżowej budownictwa i obszary ich działania zawiera załącznik nr 12 do wytycznych

II. Wytyczne wypełniania protokółⁱów kart

A. Zasady ogólne

1. Zadaniem inwestycyjnym w systemie jest całość lub część zadania inwestycyjnego wykonywana przez jednego generalnego lub częściowego wykonawcę.
2. Numery przedsięwzięć i zadań nowo rozpoczynanych w 1978 r. ustala inwestor, który jest odpowiedzialny za jednoznaczną i systematyczną numerację pozwalającą na grupowanie zadań w przedsięwzięciu oraz zachowanie numeracji aż do końca realizacji zadania. Numery przedsięwzięć i zadań kontynuowanych w 1978 r. muszą być zgodne z numeracją stosowaną dotychczas w systemie AWIZO-MOC.
3. Symbole jednostek organizacyjnych /inwestorów, wykonawców/ należy podawać zgodnie z obowiązującą identyfikacją jednostki wg GUS-REGON /na podstawie pieczętki jednostki organizacyjnej/.
4. Wypełnieniu podlegają poszczególne fragmenty dokumentów - wg objaśnień i oznaczeń symboli podanych w dokumentach, w niniejszych wytycznych lub w cytowanych w nich klasyfikacjach.

5. Dokumenty wypełnia się wpisując w każdą kratkę tylko jeden znak /cyfrę, literę/.
6. Dane określające wartości podaje się w mln zł. z jednym znakiem po przecinku.
7. Kod aktualizacji wypełniany będzie przez obsługę systemu.
8. Wartości kosztorysowe powinny być pomniejszone o udziały na inwestycje wspólne i towarzyszące podlegające przekazaniu innym jednostkom.
9. Terminy opisuje się na przykładzie: grudzień 1977 r. należy opisać 1277, marzec 1978-0378.
10. Przy wypełnianiu pól zawierających wartości liczbowe należy stosować zasadę pomijania zer nieznaczących.

B. Szczegółowe zasady wypełniania formularzy WP, PU, PUM, WPM, SM

Identyfikator zadania /nr inwestora, nr resortu inwestora, nr przedsięwzięcia i zadania / jest wspólny dla wszystkich fragmentów opisujących dane zadanie. W każdym formularzu występuje charakterystyka zadania inwestycyjnego ujęta we fragmentcie "01".

Symbol GUS resortu inwestora /kratki 3-4/

Symbol GUS resortu gen.wykonawcy /kratki 54-55/

Symbol GUS inwestora /kratki 5-11/

Symbol GUS gen.wykonawcy /56-62/

Lokalizacja zadania symboli województwa wg GUS /47-51/

- wypełniać zgodnie z numerami statystycznymi zawartymi w "Wykazie jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ich numerów statystycznych /Warszawa, Czerwiec 1976 r./.

Nr przedsięwzięcia /kratki 12-13/ i nr zadania /kratki 14-16/ wypełnia się właściwymi cyframi z uwzględnieniem pkt 2 zasad ogólnych niniejszych wytycznych.

Pełna lub skrócona nazwa zadania /kratki 17-46/ - dla zadań kontynuowanych w 1978 r. /formularze PU i PUM/, powinna być analogiczna jak w zbiorze AWIZO-MOC.

Rodzaj planu /kratka 52/ - należy podać:

- 1 - dla zadań inwestycyjnych planu centralnego
- 2 - dla zadań inwestycyjnych planu terenowego
- 3 - dla inwestycji mieszkaniowych Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.

Etap realizacji /kratka 53/:

- 1 - dla inwestycji kontynuowanych w 1978 r.
- 2 - dla inwestycji nowo rozpoczynanych w 1978 r.

Fragment "02" /formularza² WP/ i fragment "22" /formularza SM/

- wypełnia się zgodnie z objaśnieniami na formularzach oraz zgodnie z ogólnymi wytycznymi.

Fragment "12" formularza PU/

Wykonanie od początku budowy do 31.XII.77 r. - wliczane jest w cenach ówczesnie obowiązujących.

Nakłady na rok 1978 - oblicza się w cenach aktualnie obowiązujących.

Całkowita wartość robót - uwzględnia się udziały otrzymywane, nie uwzględnia przekazywanych - jest sumą wartości wliczanych wg w/w zasad tj. wykonanie do końca br. w cenach obowiązujących w poszczególnych latach, natomiast nakłady na rok 1978 w cenach aktualnie obowiązujących.

Fragmenty 23-30 /formularza SM/

Dla inwestycji kontynuowanych w 1978 r. nie należy podawać nakładów ogółem /fragment "26"/, natomiast dla inwestycji nowo rozpoczynanych w 1978 r. należy pominąć wartości w kratkach 23-40.

Fragmenty 23-30 /formularzy PUM, WPM/

wypełnia się jedynie dla inwestycji budownictwa mieszkaniowego.

C. Wyjaśnienia dotyczące karty zadań inwestycyjnych /Kl, KG i KA/

1. Wypełnieniu podlegają wszystkie fragmenty karty według objaśnień i oznaczeń symboli podanych na karcie i w wyciecznych.
Karty wypełnia się wpisując w każdą kratkę tylko jeden znak /cyfrę, literę/. Wpisując nazwy należy zachować odstęp o jedną kratkę między słowami i spójnikami.
Dane określające wartości podaje się w mln zł. z jednym znakiem po przecinku z wyjątkiem efektów zadania, które podaje się w liczbach całkowitych stosując jednostki miary podane w p.III "Oznaczenia symboli".
2. Wypełnione karty powinny być sprawdzone pod względem rachunkowym.
3. Symbole jednostek organizacyjnych /inwestorów, wykonawców/ należy podawać zgodnie z obowiązującą identyfikacją jednostki wg GUS-REGON.
4. Lokalizację zadania inwestycyjnego podawać wg symboli województw i gmin ustalonych przez GUS /patrz "Wykaz jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ich numerów statystycznych" GUS W-wa, czerwiec 1976 r.
5. Dla inwestycji o charakterze liniowym, jak szlaki kolejowe, elektryfikacja linii kolejowych, drogi państwowe, linie energetyczne, telekomunikacyjne itp. przebiegające przez kilka województw należy wypełniać karty odrębnie dla poszczególnych województw z tym, że w przypadku trudności dokładnego ustalenia wartości nakładów ogółem i wartości robót /całkowitej i w poszczególnych latach/ należy je określić szacunkowo. Podziałowi temu przypisać należy stały nr przedsięwzięcia i kolejną numerację zadań odpowiadającą zakresowi realizowanemu w danym województwie.
6. Wartości kosztorysowe w karcie KA podawane są:
 - wykonanie do końca ubiegłego roku w cenach ówczesnie obowiązujących
 - planowane nakłady na rok 1978 i dalsze lata w cenach aktualnie obowiązujących
 - wartość całkowita jest sumą wartości wyliczonych według powyższych zasad.

7. W przypadku realizacji zadania przez częściowych wykonawców w pozycji "nakłady ogółem" wypełnia się łącznie dla całego zadania na 1 karcie częściowego wykonawcy opisaną najwyższym udziałem całkowitej wartości robót budowlano-montażowych.
8. Wskaźnik inwestycji szczególnie ważnej oraz jej numer według systemu WEKTOR dotyczy tych zadań, które były imiennie omawiane w:
 - uchwale nr 225/76 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1976 r. o NPSG na 1977 r. - załącznik nr 6,
 - uchwale Biura Politycznego KC PZPR i Prezydium Rządu z dnia 1 lutego 1977 r.
9. W polu opisanym "Wypełnia obsługa systemu" /karty KA/ w kolumnie 76 należy wpisać:
 - 1 - dla zadań rozpoczętych i posiadających zgodę na ich rozpoczęcie w 1977 r.
 - 2 - dla zadań objętych planem na 1977 r. lecz wymagających indywidualnych decyzji Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

D. Wyjaśnienia dotyczące karty KM.

1. Karta zadań produkcyjnych /rzeczowo-finansowych/ zawiera informacje o wielkości produkcji budowlano-montażowej na 1978 r. w ujęciu wartościowym oraz o zadaniach rzeczowych na 1978 r. w podziale na województwa.
2. Planowane na 1978 r. zadania, przedsiębiorstwa budowlano-montażowe podają w wielkościach zgodnych z wytycznymi jednostek nadrzędnych.
3. Wartość produkcji budowlano-montażowej podaje się w siłach własnych.
4. Zadania rzeczowo-finansowe w poszczególnych rodzajach budownictwa podaje się:
 - zadania rzeczowe w generalnym wykonawstwie,

- zadania finansowe /np.wartość robót dla resortu nauki, szkolnictwa wyższego i techniki/ w generalnym i częściowym wykonawstwie.
5. Jeżeli na karcie KM ilość fragmentów 82 i 85 /województw/ jest niewystarczająca należy dołączyć dalsze karty KM, na których poza kolejnymi województwami należy wpisać - powtórzyć symbol GUS wykonawcy i nr województwa jego siedziby.
6. Fragment 81 karty KM dotyczy wartości produkcji budowlano-montażowej w skali całego przedsiębiorstwa.
Fragmenty 83 i 84 karty KM dotyczą zadań rzeczowo-finansowych w 1978 r. w generalnym wykonawstwie /i częściowym dla zadań finansowych/ w skali całego przedsiębiorstwa.
Fragmenty 82 i 85 karty dotyczą wartości produkcji budowlano-montażowej i zadań rzeczowo-finansowych w poszczególnych województwach.
7. Zadania rzeczowo-finansowe w 1978 r. podaje się w grupach:
- 1/ budownictwo mieszkaniowe, w zakresie:
 - ilość stanów surowych na koniec 1977 r. /początek 1978 r./ - w tys.m² p.u.,
 - średnie zaawansowanie tych stanów surowych w %,
 - efekty rzeczowe w 1978 r. w tys.m² pu.,
 - ilość stanów surowych na koniec 1978 r. w tys.m² pu.,
 - średnie zaawansowanie w %.Dane podaje się tylko w odniesieniu do uspołecznionego budownictwa mieszkaniowego dla ludności nierolniczej,
 - 2/ budownictwo urządzeń socjalno-usługowych finansowane ze środków na budownictwo mieszkaniowe, w zakresie:
 - efekty ogółem - w tys.m²pu.,
 - w tym w urządzeniach podstawowych - w tys.m²pu.
 - 3/ budownictwo dla resortu nauki, szkolnictwa wyższego i techniki, w zakresie:
 - efekty w domach studenckich i hotelach asystenckich - w ilości miejsc,

7. W przypadku realizacji zadania przez częściowych wykonawców w pozycji "nakłady ogółem" wypełnia się łącznie dla całego zadania na 1 karcie częściowego wykonawcy opisaną najwyższym udziałem całkowitej wartości robót budowlano-montażowych.
8. Wskaźnik inwestycji szczególnie ważnej oraz jej numer według systemu WEKTOR dotyczy tych zadań, które były imiennie omawiane w:
 - uchwale nr 225/76 Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1976 r. o NPSG na 1977 r. - załącznik nr 6,
 - uchwale Biura Politycznego KC PZPR i Prezydium Rządu z dnia 1 lutego 1977 r.
9. W polu opisanym "Wypełnia obsługa systemu" /karty KA/ w kolumnie 76 należy wpisać:
 - 1 - dla zadań rozpoczętych i posiadających zgodę na ich rozpoczęcie w 1977 r.
 - 2 - dla zadań objętych planem na 1977 r. lecz wymagających indywidualnych decyzji Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

D. Wyjaśnienia dotyczące karty KM.

1. Karta zadań produkcyjnych /rzeczowo-finansowych/ zawiera informacje o wielkości produkcji budowlano-montażowej na 1978 r. w ujęciu wartościowym oraz o zadaniach rzeczowych na 1978 r. w podziale na województwa.
2. Planowane na 1978 r. zadania, przedsiębiorstwa budowlano-montażowe podają w wielkościach zgodnych z wytycznymi jednostek nadrzędnych.
3. Wartość produkcji budowlano-montażowej podaje się w siłach własnych.
4. Zadania rzeczowo-finansowe w poszczególnych rodzajach budownictwa podaje się:
 - zadania rzeczowe w generalnym wykonawstwie,

- zadania finansowe /np.wartość robót dla resortu nauki, szkolnictwa wyższego i techniki/ w generalnym i częściowym wykonawstwie.
5. Jeżeli na karcie KM ilość fragmentów 82 i 85 /województw/ jest niewystarczająca należy dołączyć dalsze karty KM, na których poza kolejnymi województwami należy wpisać - powtórzyć symbol GUS wykonawcy i nr województwa jego siedziby.
6. Fragment 81 karty KM dotyczy wartości produkcji budowlano-montażowej w skali całego przedsiębiorstwa.
Fragmenty 83 i 84 karty KM dotyczą zadań rzeczowo-finansowych w 1978 r. w generalnym wykonawstwie /i częściowym dla zadań finansowych/ w skali całego przedsiębiorstwa.
Fragmenty 82 i 85 karty dotyczą wartości produkcji budowlano-montażowej i zadań rzeczowo-finansowych w poszczególnych województwach.
7. Zadania rzeczowo-finansowe w 1978 r. podaje się w grupach:
- 1/ budownictwo mieszkaniowe, w zakresie:
 - ilość stanów surowych na koniec 1977 r. /początek 1978 r./ - w tys.m2 p.u.,
 - średnie zaawansowanie tych stanów surowych w %%,
 - efekty rzeczowe w 1978 r. w tys.m2 pu.,
 - ilość stanów surowych na koniec 1978 r. w tys.m2 pu.,
 - średnie zaawansowanie w %%.Dane podaje się tylko w odniesieniu do uśrednionego budownictwa mieszkaniowego dla ludności nierolniczej,
 - 2/ budownictwo urządzeń socjalno-usługowych finansowane ze środków na budownictwo mieszkaniowe, w zakresie:
 - efekty ogółem - w tys.m2pu.,
 - w tym w urządzeniach podstawowych - w tys.m2pu.
 - 3/ budownictwo dla resortu nauki, szkolnictwa wyższego i techniki, w zakresie:
 - efekty w domach studenckich i hotelach asystenckich - w ilości miejsc,

- efekty w budynkach dydaktycznych - w tys.m³,
- wartość robót w 1978 r. w generalnym /częściowym/ wykonawstwie dla wszystkich inwestycji resortu nauki, szkolnictwa wyższego i techniki - w mln zł.,

4/ budownictwo oświaty, w zakresie:

- szkoły - efekty rzeczowe ogółem w ilości pomieszczeń do nauki,
 - w tym dla resortu oświaty i wychowania - w ilości pom.do nauki,
- przedszkola - efekty rzeczowe ogółem - w ilości miejsc, - w tym dla resortu oświaty i wychowania - w ilości pom.do nauki,

5/ budownictwo służby zdrowia, w zakresie:

- szpitale i sanatoria ogółem - efekty w ilości łóżek,
 - w tym dla resortu zdrowia /plan centralny i terenowy/ - efekty w ilości łóżek,
- żłobki ogółem - efekty w ilości miejsc,
 - w tym w resorcie zdrowia /plan centralny i terenowy/ - efekty w ilości miejsc,
- wartość robót w 1978 r. w generalnym /częściowym/ wykonawstwie we wszystkich inwestycjach tylko resortu zdrowia planu centralnego i terenowego /szpitale, sanatoria, żłobki, kolumny transportu sanitarnego, przychodnie itp./,

6/ budownictwo hotelowe /hotele ORBIS i komunalne/ - efekty w ilościach miejsc,

7/ budownictwo przemysłowe, w zakresie:

- ogółem zadania rzeczowe:
 - ilość zadań lub obiektów - w sztukach,
 - całkowita wartość robót,
- zadania imienne ujęte w planie rzeczowym:
 - ilość zadań lub obiektów - w sztukach,
 - całkowita wartość robót,
- w tym zadania szczególnie ważne dla gospoarki narodowej:
 - ilość zadań lub obiektów - w sztukach,
 - całkowita wartość robót.

8. Karty zadań produkcyjnych powinny być bieżąco aktualizowane.

III. Oznaczenia podstawowych symboli w kartach.

Przyjęte klasyfikacje zadań inwestycyjnych są zgodne z instrukcją Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w sprawie sporządzania planu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju na lata 1976-1980 i oznaczają kolejno:

1. "GI" - grupa inwestycji

- 1 - inwestycje jednostek i zakładów budżetowych, finansowanych zarówno ze środków budżetowych, jak i pozabudżetowych, pochodzących z funduszy społecznych, specjalnych, mieszkaniowych i socjalnych /tj. z zakładowych funduszy mieszkaniowych i socjalnych/,
- 2 - inwestycje w organizacjach gospodarczych obejmujące dotychczasowe:
 - a/ inwestycje branżowe /kredytowe/
 - b/ inwestycje przedsiębiorstw /funduszowe/ finansowe z:
 - funduszy rozwoju tworzonych w jednostkach objętych nowymi zasadami ekonomiczno-finansowymi,
 - funduszy inwestycyjno-remontowych pozostałych przedsiębiorstw
 - zakładowego funduszu mieszkaniowego w części przeznaczonej w planie na inwestycje do realizacji własnej /uchwała nr 120 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1971 r. w sprawie rozwoju zakładowego budownictwa mieszkaniowego/,
 - zakładowego funduszu socjalnego w części przeznaczonej na inwestycje własne w rozumieniu postanowień §§ 2,5 ust.2 uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. w sprawie zasad planowania, finansowania i realizacji inwestycji socjalnych /MP nr 22, poz.129/,
 - funduszy inwestycyjnych jednostek badawczych i szkół wyższych /uchwała nr 289 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia

1973 r. w sprawie zasad finansowania prac badawczych i wdrożeniowych oraz gospodarki finansowej jednostek

badawczych i szkół wyższych - /M.P. nr 2/74 poz.9/,

- funduszu rozwoju zaplecza produkcyjno-usługowego i socjalno-administracyjnego budownictwa /zarządzenie nr 81 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 września 1972 r. - /MP nr 51, poz.270/,

3 - inwestycje spółdzielczości zarówno finansowane z kredytów, jak i z tworzonych w organizacjach spółdzielczych funduszy rozwoju na cele inwestycyjne oraz funduszy inwestycyjno-remontowych spółdzielczości mieszkaniowej,

4 - inwestycje organizacji społecznych, politycznych i zawodowych polegające na budownictwie inwestycyjnym.

"R1" - rodzaj inwestycji

- 1 - odtworzeniowo-modernizacyjne. Do inwestycji tych należy zaliczać:
 - zakupy maszyn i urządzeń dla odtworzenia i wymiany zużytego technicznie bądź ekonomicznie wyposażenia techniczno-produkcyjnego lub jego uzupełnienia wraz z robotami budowlano-montażowymi niezbędnymi dla jego zainstalowania na istniejących powierzchniach produkcyjnych,
 - inwestycje służące poprawie warunków pracy i ochrony środowiska z wyjątkiem inwestycji o charakterze socjalnym i mieszkaniowym finansowanych z zakładowych funduszy - socjalnego i mieszkaniowego,
- 2 - rozbudowa w istniejących zakładach, jako - rozbudowa lub generalna modernizacja całego zakładu lub poszczególnych jego wydziałów, w tym również w zakresie działalności pomocniczej i usługowej,

- 3 - budowa nowych zakładów do której należy zaliczać inwestycje polegające na budownictwie inwestycyjnym związane z tworzeniem nowych, nie istniejących dotychczas ośrodków produkcji lub usług,
- 4 - inwestycje pozostałe, do grupy których zalicza się zadania inwestycyjne nie posiadające bezpośredniego charakteru produkcyjnego i nie wchodzące w skład przedsięwzięć produkcyjnych.

3. "RP" - rodzaj planu

- 1 - plan centralny
- 2 - plan terenowy.

4. "IW" - wskaźnik inwestycji szczególnie ważnych

- patrz p.II.1.

5. "CN" - cykl normatywny /w miesiącach/

6. "CD" - cykl dyrektywny /w miesiącach/

7. "WA" - wskaźnik występowania w zadaniu automatyki przemysłowej

- 1 - tak
- 2 - nie

8. "WP" - wskaźnik przyjęcia zadania /objektu/ do realizacji

- 1 - przyjęto
- 2 - nie przyjęto

9. Jednostki miary efektów - wg "Klasyfikacji Obiektów Budowlanych"

/Zeszyty Metodyczne GUS, Warszawa 1976 r./.

Zakres symboli	Nazwa podzbioru	Jednostka miary	
		znaczenie	symbol
110-199	Budynki mieszkalne i użytku publicznego	m ² pow. użyt.	96
		tys. zł.	11
210-299	Budynki produkcyjne i usługowe	j. w.	j. w.
310-399	Budowle przemysłowe naziemne	m ³	60
		tys. zł.	11
410-429	Budowle górnicze dołowe	m	40
		tys. zł.	11
510-599	Budowle inżynierskie lądowe /tam gdzie niemożliwe stosowanie powyższych jednostek dopuszcza się stosowanie	km	43
		tys. zł.	11
		m	40
		m ²	50
610-699	Budowle inżynierskie wodne /dodatkowo stosować jednostki podane w KOB dla opisanego podzbioru/	m ³	60
		tys. zł.	11
710-799	Linie i sieci elektroenergetyczne, elektrotrakcyjne i telekomunikacyjne	km	43
		tys. zł.	11
810-890	Melioracje, zasadzenia wieloletnie, urządzenia terenów zielonych	ha	52
		tys. zł.	11

Efekty zadania należy opisywać dwukrotnie:

a/ w podanych jednostkach naturalnych /i tylko w tych/

b/ w tys. złotych

pozostałe jednostki miary dopuszczalne w "Klasyfikacji Obiektów Budowlanych" nie należy w systemie stosować.

Ministerstwo - Urząd Wojewódzki
- Centralny Związek
/pieczętka/

Rozliczenie nakładów inwestycyjnych
na roboty budowlano-montażowe przewidziane do
realizacji w 1978 r.

w mln zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Razem nakłady	z tego:		w tym: bud. miesz.	
			K	N	razem	w tym: N
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nakłady na roboty budowlano-montażowe					
2.	Udziały na inwestycje wspólne i towarzyszące:					
	1/ przekazywane - innym resortom, - urzędom wojewódzkim					
	2/ otrzymywane - od innych resortów - od urzędów wojewódzkich					
3.	Razem nakłady /1-2.1. + 2.2./					
4.	Rezerwa nakładów					
5.	Nakłady do zagospodarowania /3-4/ z tego do realizacji:					
	1/ systemem gospodarczym,					
	2/ systemem zlecieniowym z tego przez:					
	a/ własne p-stwa, wykonawcze					
	b/ Ministerstwo Bud. i PMB z tego:					
	- Białostockie ZB /wymienić pozostałe zj. nadzorujące wykonawców/,					
	c/ Ministerstwo Górnictwa,					
	d/ Min. Energetyki i E.A.,					
	e/ Min. itd. /wym. pozostałe resorty wykonawcze/					

Uwaga:

- Urzędy wojewódzkie opracowują rozliczenie nakładów bez wydziałów rolnictwa,
- Min. Rolnictwa opracowuje rozliczenie łącznie z inwestycjami wydziałów rolnictwa Urzędów Wojewódzkich,

3/ Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego
opracowuje rozliczenie dla spółdzielczego budownictwa
mieszkaniowego,

4 K - inwestycje kontynuowane

5 N - inwestycje nowo rozpoczynane

..... dnia1977 r.

Dyrektor Departamentu

.....



PROTOKÓŁ

UZGODNIENIE ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻ.
W INWESTYCJACH KONTYNUOWANYCH W ROKU 1978

INWESTOR BEZPOŚREDNI

PEŁNA NAZWA LUB PIERZEC INWESTORA

GENERALNY CZĘŚĆ WYKONAWCA

PEŁNA NAZWA LUB PIERZEC WYKONAWCY

3 4
SYMB. RESORTU
INWESTORA wg GUS

5 41
SYMBOL GUS
INWESTORA

42 43
NR PRZEDSI-
WZIĘCIA

14 46
NR ZADANIA

01
1 2

17 46
PEŁNA LUB SKRÓCONA NAZWA ZADANIA

47 51
LOKALIZACJA
ZAD. wg GUS

52
RODZAJ
PLANU

53
ETAP
REALIZ.

54 55
SYMBOL GUS
RES. WYKON.

56 62
SYMB. GUS GENERAL
CZĘŚĆ WYKONAWCY

80
KA

INWESTOR: MINISTERSTWO/URZĄD WÓJ./

ZJEDNOCZENIE

GEN./CZĘŚĆ WYKONAWCA:

MINISTERIUM:

ZJEDNOCZENIE:

12
1 2

17 22
CAŁKOW. WARTOŚĆ
ROB. BUD-MONT.

23 28
WYKONANIE ROBÓT
OD POZ. BUDOWY DO 31. XII. 1977

29 34
NAKLADY NA ROK 1978
NIEZBĘDNE DO ZAKON.
ZADANIA W TERMINIE

35 40
NAKLADY NA ROK 1978
WG LIMITU INWESTORA

41 46
NAKLADY wg WYKON.

47 52
NAKLADY UZGODNIONE
NA 1978

53 58
W TYM SŁY WŁASNE
GEN./CZĘŚĆ WYKON.

TERMINY ZAKOŃCZENIA w-c, ROK!

59 62
wg UMÓWY

63 64
PROPOZYCYJNY
PRZEZ INWEST.

67 70
PROPOZYCYJNY
PRZEZ WYKON.

71 74
UZGODNIJONY

80
KA

DYREKTOR INWEST. BEZP.
/pieczęć, podpis/

DYREKTOR GEN./CZĘŚĆ WYKONAWCY
/pieczęć, podpis/

DYREKTOR ZJEDNOCZENIA INWEST.
/pieczęć, podpis/

DYREKTOR ZJEDNOCZENIA WYKON.
/pieczęć, podpis/

PUM

ZAKRES RZECZOWO - WARTOŚCIOWY
 ZADANIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
 UZGODNIJONY MIĘDZY INWESTOREM I WYKONAWCĄ

STOJBY I POPRZĘKI

RAZEM	WYKONANO DO 31 12 1976	1977 ROK		1976 ROK		W CAŁYMI MILIONAMI ZŁOTYCH	VA
		PLAN	WYKONANIE	W GÓRNYM CZĘŚĆ WYKONA	W CAŁYMI MILIONAMI ZŁOTYCH		
17	22	28	34	40	46	52	90

ZAKRES RZECZOWY

/ w m² p. u. m. /

2,3
2,4
2,5
1,2

EFEKTY	STANY	STANY	STANY	STANY	STANY	STANY	STANY
STANY SUBOWE	?	?	?	?	?	?	?
NA KONIEC ROKU	?	?	?	?	?	?	?
% ZAMAWIOWANIA	?	?	?	?	?	?	?
STANÓW SUBOWYCH	?	?	?	?	?	?	?

ZAKRES WARTOŚCIOWY

/ w mln zł /

2,7
2,8
2,9
3,0
1

W TYM	ROBOTY	ROBOTY	ROBOTY	ROBOTY	ROBOTY	ROBOTY	ROBOTY
OBIEKTY	?	?	?	?	?	?	?
MIEZKALNE	?	?	?	?	?	?	?
INWESTYCJE	?	?	?	?	?	?	?
TOWARYSZACZ	?	?	?	?	?	?	?
ROBOTY	?	?	?	?	?	?	?
NIECUBATOWE	?	?	?	?	?	?	?



WSTĘPNA PROPOZYCJA

ZAPEWNIENIA WYKONAWSTWA DLA NOWO ROZPOCZYNYANEGO
ZADANIA INWESTYCYJNEGO NA ROK 1978

INWESTOR BEZPOŚREDNI -----
/PEŁNA NAZWA LUB PIECZĘĆ INWESTORA/

GENERALNY /CZĘŚĆ/ WYKONAWCA -----
/PEŁNA NAZWA LUB PIECZĘĆ WYKONAWCY/

$\frac{3}{4}$
SYMBOL RESORTU
INWESTORA wg GUS

$\frac{5}{11}$
SYMBOL GUS INWEST.

$\frac{12}{13}$
NR PRZEDSIĘ-
WZIECIA

$\frac{14}{16}$
NR ZADANIA

$\frac{01}{1 \quad 2}$

$\frac{17}{46}$
PEŁNA LUB SKRÓCONA NAZWA ZADANIA

$\frac{47}{54}$
LOKALIZACJA
ZAD. wg GUS

$\frac{52}{53}$
RODZAJ
PLANU

$\frac{54}{55}$
ETAP
REALIZ.

$\frac{56}{62}$
SYMBOL GUS
RES. WYKON.

$\frac{62}{80}$
SYMB. GUS GENERAL.
/CZĘŚĆ/ WYKONAWCY

$\frac{80}{80}$
KA

INWESTOR: MINISTERSTWO /URZ. WOJEW./ -----

ZJEDNOCZENIE -----

WYKONAWCA GEN./CZĘŚĆ:
MINISTERSTWO -----

ZJEDNOCZENIE -----

$\frac{02}{1 \quad 2}$

CAŁKOWITA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA
NAKŁADY NA 1978 ROK

OGÓŁEM
w MLN zł.

ROBOTY BUD-MONT
w MLN zł.

$\frac{17}{22}$ $\frac{23}{26}$

ZŁOŻONE DO WYKONAWSTWA

$\frac{29}{33}$ $\frac{34}{38}$

PROPONOWANE DO PRZYJĘCIA
PRZEZ WYKONAWCĘ

$\frac{39}{43}$ $\frac{44}{48}$

UZGODNIONE MIĘDZY INWESTOREM
A WYKONAWCĄ

$\frac{49}{53}$ $\frac{54}{58}$

W TYM SŁEY WŁASNE GENERALALNEGO WYKONAWCY

$\frac{59}{63}$

$\frac{64}{67}$
TERMIN ZATWIER.
Z.T.E. /m-c. rok/

$\frac{68}{71}$
UZGODN. TERMIN
DOSTARCZENIA DOKUMENT.
ZA OKRES ROBÓT 1978 /m-c. rok/

$\frac{72}{73}$
CYKL REALIZACJI
W MIESIĄCACH

$\frac{80}{80}$
KA

DYREKTOR INWESTORA BEZPOŚR.
/pieczęć, podpis/

DYREKTOR GEN./CZĘŚĆ/ WYKONAWCY
/pieczęć, podpis/

DYREKTOR ZJEDNOCZENIA INWEST.
/pieczęć, podpis/

DYREKTOR ZJEDNOCZENIA WYKONAWCY
/pieczęć, podpis/

WPM

**ZAKRES RZECZOWO - WARTOŚCIOWY
ZADANIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
UZGODNIONY MIĘDZY INWESTOREM I WYKONAWCĄ**

COLONY 5-15 PRZEBOWĄD Z POPRZEDNICH STADIUM

	17	22	25	24	40	1978 ROK	
						W GŁÓWNYM KONTRAKCIE WYKONAWSTWA	32
						31 W TYM OGRAZDNIENIE WYKONAWCY	30
						KA	30

ZAKRES RZECZOWY

/ w m² p. u. m. /

EFEKTY	1	1	1	1	1		
STANY SUROWE NA KONIEC ROKU	1	1	1	1	1		
% ZAWANSOWANIA STANÓW SUROWYCH	1	1	1	1	1		

2,5
2,4
2,5
1,2

ZAKRES WARTOŚCIOWY

/ w mln zł /

WALDZY COOLEN	1	1	1	1	1		
W TYM	1	1	1	1	1		
OBIEKTY MIESZKALNE	1	1	1	1	1		
INWESTYCJE TOWARZYSZĄCE	1	1	1	1	1		
WYKONAWSTWA NIEKUPATUROWE	1	1	1	1	1		

2,6
2,7
2,8
2,9
3,0
1,2


SM


PROTOKÓŁ


UZGODNIENIA ZAKRESU RZECZOWEGO I ROBÓT
BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH W SPÓŁDZIELCZYM
BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM NA ROK 1978.


INWESTOR BEZPOŚREDNI -----
/PEŁNA NAZWA LUB PIECZĘĆ INWESTORA/

GENERAŁNY /CZĘŚĆ/ WYKONAWCA -----
/PEŁNA NAZWA LUB PIECZĘĆ WYKONAWCY/


 5 4
SYMB. RESORTU
INWESTORA wg GUS

 5 11
SYMBOL GUS
INWESTORA

 12 45
NR PRZEDSIĘ-
WZIĘCIA

 46 46
NR ZADANIA


 0 1
1 2


 47 46
PEŁNA LUB SKRÓCONA NAZWA ZADANIA

 47 31
LOKALIZACJA
ZAD. wg. GUS

 3 32
RODZAJ
PLANU

 35 35
ETAP
REALIZ.

 54 55
SYMBOL GUS
BES WYKON.

 56 62
SYMB. GUS GENERAL.
/CZĘŚĆ/ WYKONAWCY

 80 80
KA

INWESTOR : WOJEWÓDZKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA
MIESZKANIOWEGO w -----


GEN. /CZĘŚĆ/ WYKONAWCA:


MINISTERSTWO: -----

ZJEDNOCZENIE: -----

 2 2
1 2


LIMIT NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W R.B.-M NA ROK 1978
/w mln zł/


 17 22
POSADZANY PRZEZ
INWESTORA

 25 28
PROFONOWANY PRZEZ
WYKONAWCĘ

TERMINY ZAKOŃCZENIA /m-c, rok /

 24 32
wg. UMOWY.

 35 36
PROFONOWANY
PRZEZ INWESTORA

 37 40
PROFONOWANY
PRZEZ WYKON.

 44 44
UZGODNIONY

 80 80
KA



**ZAKRES RZECZOWO - WARTOŚCIOWY
ZADANIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
UZGODNIONY MIĘDZY INWESTOREM I WYKONAWCĄ**

KOLONY 2-4 PRZEGLĄDAC I PORÓBNIK ŚRODY

RAZEM	WYKONANO SI 42 1976	1977 ROCZ. PLAN	1978 ROC. W GENERALNYM KALENDARZU WSTĘPNE WYKONANIE
17	22	28	46
		34	46
			46
			46

ZAKRES RZECZOWY

/ w m² p. u. m. /

EFEKTY	
STANY SUROWE NA KONIEC ROZU	
% ZAWANOWANIA STANÓW SUROWYCH	

- [2.3]
- [2.4]
- [2.5]

ZAKRES WARTOŚCIOWY

/ w mln zł /

NAKLADY OGÓLNE	
ROBOTY BUDOWLANO - MONT	
W TYM:	
OBJEKTY MIESZKALNE	
INWESTYCJE	
TOWARZYSZĄCE	
ROBOTY NIEKUBATOWNE	

- [2.6]
- [2.7]
- [2.8]
- [2.9]
- [3.0]

INWESTOR BIEPOŚREDNI
PREZES
DYREKTOR

WOTWÓDZKA SPÓŁDZIELNA
MIEZKANIOWA
WOTWÓDZKAJ SPÓŁDZIELNA
BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
GENERAŁNEGO /
WYKONAWCY

WOTWÓDZKA SPÓŁDZIELNA
MIEZKANIOWA
GENERAŁNEGO /
WYKONAWCY
DYREKTOR
ZJEDNOCZONA, GENERALNEGO
/
CIEŚLIOWEGO WYKONAWCY

INWESTOR BIEPOŚREDNI
PREZES
DYREKTOR

WOTWÓDZKA SPÓŁDZIELNA
MIEZKANIOWA
WOTWÓDZKAJ SPÓŁDZIELNA
BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
GENERAŁNEGO /
WYKONAWCY

WOTWÓDZKA SPÓŁDZIELNA
MIEZKANIOWA
GENERAŁNEGO /
WYKONAWCY
DYREKTOR
ZJEDNOCZONA, GENERALNEGO
/
CIEŚLIOWEGO WYKONAWCY

/pieczęć, podpis/

/pieczęć, podpis/

/pieczęć, podpis/

Załącznik nr 6

W y k a z

kontynuowanych /kończonych w 1978 r. i w I kwartale 1979 r., kończonych po I kw. 1979 r.*/
 nowe rozpoczętych /zadani inwestycyjnych realizowanych systemem gospodarczym x/ przez
 przedsiębiorstwa budowlano-montażowe x/ Ministerstwa x/ - Urzędu Wojewódzkiego x/ w 1978 r.

w mln zł

Lp.	Resort inwestorski - urząd wojewódzki	Nr zadania inwestycyjnego	Wartość całkowita robót budowlanych	Wykonanie do 31.12.77	Wartość robót na 1978 r. w kontraktach wykonywanych w własnych częściach	Terminy	Generalny /częściowy/ Wykonawca		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
R a z u m i									

.....dnia.....1977 r.

D Y R E K T O R

U w a g i:

1/ x - wypełnić oddzielnie dla systemu gospodarczego i systemu zleceniowego, a w systemie zleceniowym oddzielnie dla inwestycji kontynuowanych kończonych w 1978 r. i w I kw. 1979 r., kontynuowanych kończonych po I kw. 1979 r. i nowe rozpoczętych w 1978 r.

2/ x - oznacza niepotrzebne - skreślić.

ETOBYSYSTEM
WARSZAWA



AWIZO-MOC

KARTA ZADANIA (Cz. ZADANIA) INWESTYCYJNEGO

Cz. I ZLECENIE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
W GENERALNYM (CZĘŚCIOWYM) WYKONAWSTWIE

INWESTOR BEZPOŚREDNI _____

GEN. (CZĘŚCIOWY) WYKONAWCA _____

BIURO GEN. PROJEKTANTA _____

Symbol GUS inwestora _____ Nr przedsięwzięcia _____ Nr za datą _____
wypełnia obsługa syst. _____

1.1
1 2

Pełna lub skrócona nazwa zadania _____

lok. zadania wg GUS / wg GmJ _____
G1 5A R1 52 RP 53 IW 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

W zad. wg WKTORW symb. GUS gen. dla inwest. i cz. wazn. czesc. wykon. _____
symb. GUS gen. projektanta _____

1.2
1 2

Planowane terminy / m-c, rok /

zatrudn. ZTE _____
przekaz. terenu bud. _____
rozpocz. robót _____
osiagn. PZP _____
dost. dokum. dla rob. 1-roku _____
rozp. dost. maszyn, urzadz. _____
zakonc. robót _____
oddania do eksploat. _____
osagn. PZP _____
CN _____
CD _____
WA _____
WP _____
KA _____

PODZIAŁ NAKŁADÓW W LATACH W MLN. ZŁ. (BEZ UDZIAŁU PRZEKAZYWANEGO)
DO WYKONANIA W GENERALNYM (CZĘŚCIOWYM) WYKONAWSTWIE

1.3
1.4
1.5
1 2

okresienie nakładów	wartosc całkowita	przed rok	w roku	w nastep	w nastep	pozost. lata	KA
		rozp. rob.	rozp. rob.	roku	roku		
15	20	25	30	35	40	45	80
nakłady ogółem	?	?	?	?	?	?	
roboty bud-mont.	?	?	?	?	?	?	
w tym wart. bud. mieszk. w rnm.	?	?	?	?	?	?	

STRUKTURA ROBÓT BUD-MONTAŻOWYCH ZADANIA W LATACH W MLN. ZŁ.

1.6
1 2

rodzaje robót	lp	wartosc całkowita	w roku	w nastepn.	w nastepn.	pozostalo lata	KA
			rozp. rob.	roku	roku		
ogolno budowlane	1	?	?	?	?	?	
montaz konstrukcji	2	?	?	?	?	?	
instal. przemysl i sanit.	3	?	?	?	?	?	
instal. elektryczne	4	?	?	?	?	?	
inzynieryjne	5	?	?	?	?	?	
kociole	6	?	?	?	?	?	
montaz maszyn i urzadz.	7	?	?	?	?	?	
pozostale	8	?	?	?	?	?	

UWAGI: _____

GEN WYKONAWCA _____

INWESTOR _____

ZJED WYKONAWCY _____

ZJED INWESTORA _____

data - podpis

data - podpis

ETOSYSTEM
WARSZAWA



AWIZO-WOC

WYKAZ I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW KUBATUROWYCH ZADANIA

(perforuj kol 3-14 i 76-79 z poprzedniej strony)

symbol wg KOB	data rozpoc. realiz. m-c, rok	rodzaj realizacji	długość w m	szer. w m	wysok. w m	ilość kon- dug.	ilość konstrukcji		wp m ²	KA
							ton-stal	selbetowe m ³		
45	24	75	32	35	36	40	45	5157	80	
RAZEM										

RODZAJ ROZWIĄZANIA MATERIAŁ. KONSTR. OBIEKTU

- 01 - p-70j seibel /
- 02 - pp / seibel /
- 03 - inne rozwi. syst. seibel.
- 04 - LMS - OBT / stal /
- 05 - LMS - OTW / stal /
- 06 - LMS - OTW / stal /
- 07 - LMS - NIBT / stal /
- 08 - inne rozwi. syst. stali.
- 09 - BK / drewno /
- 10 - w-70
- 11 - uk-70
- 12 - szlach
- 13 - ow-70
- 14 - wue-70
- 15 - ow-75
- 16 - ow-75
- 17 - ow-75
- 18 - ow-75
- 19 - ow-75
- 20 - ow-75
- 21 - ow-75
- 22 - ow-75
- 23 - ow-75
- 24 - ow-75
- 25 - ow-75
- 26 - ow-75
- 27 - ow-75
- 28 - ow-75
- 29 - ow-75
- 30 - ow-75
- 31 - ow-75
- 32 - ow-75
- 33 - ow-75
- 34 - ow-75
- 35 - ow-75
- 36 - ow-75
- 37 - ow-75
- 38 - ow-75
- 39 - ow-75
- 40 - ow-75
- 41 - ow-75
- 42 - ow-75
- 43 - ow-75
- 44 - ow-75
- 45 - ow-75
- 46 - ow-75
- 47 - ow-75
- 48 - ow-75
- 49 - ow-75
- 50 - ow-75
- 51 - ow-75
- 52 - ow-75
- 53 - ow-75
- 54 - ow-75
- 55 - ow-75
- 56 - ow-75
- 57 - ow-75
- 58 - ow-75
- 59 - ow-75
- 60 - ow-75
- 61 - ow-75
- 62 - ow-75
- 63 - ow-75
- 64 - ow-75
- 65 - ow-75
- 66 - ow-75
- 67 - ow-75
- 68 - ow-75
- 69 - ow-75
- 70 - ow-75
- 71 - ow-75
- 72 - ow-75
- 73 - ow-75
- 74 - ow-75
- 75 - ow-75
- 76 - ow-75
- 77 - ow-75
- 78 - ow-75
- 79 - ow-75
- 80 - ow-75
- 81 - ow-75
- 82 - ow-75
- 83 - ow-75
- 84 - ow-75
- 85 - ow-75
- 86 - ow-75
- 87 - ow-75
- 88 - ow-75
- 89 - ow-75
- 90 - ow-75
- 91 - ow-75
- 92 - ow-75
- 93 - ow-75
- 94 - ow-75
- 95 - ow-75
- 96 - ow-75
- 97 - ow-75
- 98 - ow-75
- 99 - ow-75

- WP WSKAŹNIK PRZYJĘCIA
- 1- przyjęto zadanie / obiekt do realizacji
- 2- nie przyjęto zadania / obiektu do realizacji
- 01 01 - grupa inwestycji
- 1- inwestycja jednorokowa - zaku. bud.
- 2- organizacja gospodarczych
- 3- organizacja społecznych
- 4- organizacja społecznych
- RI RODZAJ INWESTYCJI
- 1- odnowienie - moderniz.
- 2- rozbudowa w istniejącej zakł.
- 3- budowa nowych zakł.
- 0- pozostałe
- RP RODZAJ PLANU
- 1- centralny
- 2- terenowy
- IW WSKAŹNIK INWESTYCJI
- 1- szeregowe ważne
- 2- pozostałe
- 61 - w-1 podaj nr zadania wg WĘKTOR W
- CN cyki normatywny / m-ce /
- CD cyki dyrektywny / m-ce /
- WA WSKAŹNIK WYKONANIA W ZADANIU AUTOMATYKI PRZEMISŁOWEJ
- 1- 1 pkt
- 2- nie

- okreslenie
- 1 - beton / seibel /
- 2 - st. stal / seibel /
- 3 - blach. fab. / seibel /
- 4 - inne nieokreślone
- 5 - beton / seibel /
- 6 - bl. stal / seibel /
- 7 - bl. alum. / seibel /
- 8 - pref. płyty warstwa / seibel /
- 9 - imp. / seibel /
- 0 - inne nieokreślone


ETOSYSTEM W-wa

KG

AWIZO-MDC

KARTA ZADANIA (Cz.ZAD) INWESTYCYJNEGO


Cz. II POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻ DO GENERALNEGO / CZĘŚCIOWEGO WYKONAWSTWA #/


 symbol GUS inwestora _____ Nr przedsięb. Nr zadania _____

wypełnia obsługa syst. _____
 76 76

31
1 2

przyjęte terminy /m-c, rok/


 15 18 19 22 23 26 27 30 31 34 35 38 39 40 41 42 80
 rozpocz. przekaz. rozp. dost. zakończ. oddania osiągnięcia CN CD KA
 robot teren bud. masz i urz robot do eksplo. pzp

WARTOŚĆ WAKŁADÓW OGÓŁEM I ROBÓT W GENERALNYM (CZĘŚCIOWYM) WYKONAWSTWIE w MLN. ZŁ

32
33
34
35
1 2

określenie nakładów	wartość całkowita	19...	19....	19.....	40	KA
		20	25	30	35	
nakłady ogółem
rbm w gen. części wykon.
w tym	sily własne
	podwykonawcy

STRUKTURA ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻ. ZADANIA w MLN. ZŁ.

36
1 2

rodzaje robót	wartość całkowita	19...	19....	19.....	40	KA
		20	25	30	35	
ogólno budowlane	1
montaż konstrukcji	2
instal. przemysł. i sanit.	3
instal. elektryczne	4
inżynieryjne	5
kolejowe	6
montaż masz i urz. szl.	7
pozostałe	8

EFEKTY RZECZOWE (wg KLASYFIKACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH)

37
1 2

nazwa efektu	symb. braku wg ROB	jedn. miarowy	ogółem	efekty do oddania				KA
				19...	19....	19.....	40	
			25	31	37	43	49	80

GEN WYKONAWCA _____
 ZJEDN. WYKONAWCY _____
 INWESTOR _____
 ZJEDN. INWESTORA _____

#/ niepotrzebne skreślić

dat - podpisy



AWIZO-MOC

KARTA AKTUALIZACJI INFORMACJI O ZADANIU INWESTYCYJNYM REALIZOWANYM W GENERAL- NYM ICZĘŚCIOWYM) WYKONAWSTWIE

INWESTOR _____
WYKONAWCA _____

4.1
1 2

Symbol GUS inwestora

Nr zadania - Nr zadania
siewzaleca

KA 3
80

Wypolna obsl oyst

1.1
1 2

Pełna lub skrócona nazwa zadania _____

loka. zadania wg GUS /woj, gmina/ GI RI RP IW NR zadania wg MEKOR w dia inwest siczeg walne symbol GUS ger. KA

3.1
1 2

TERMINY /m-c, rok/

rozpocz robot przebieg teren bud rozp. rob. masz. uzr zakonc. robot oddania do eksploat CN CD KA

PODZIAŁ NAKŁADÓW W LATACH W MLN zł /bez udziałów przekazywanych/

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
1 2

	wartosc całkowita		wykonanie do konca ub roku		rok bieżący				plan na lata nastepne			W
	75	20	25	30	35	40	45	50	55	60		
naklad ogol												
rodz. uogol. um.												
w tym: 3111 wlosne												
4000 podwyz												
wan. cz. masz. - 102 w kon												

EFEKTY RZECZOWE /wg klasyfikacji Operow Budowlanych/

4.6
1 2

nazwa efektu	symbol efektu	rok realizacji	ogolem	efekty oddane /oo oddania/				W
				do konca ub roku	rok biez.	rok nast.	pozostale lata	
		75	17.10.80	25	31	37	43	50

UWAGI _____

INWESTOR _____ data - podpis

WYKONAWCA _____ data - podpis

SPRAWDZONO zjedn nadzor wykon _____ data - podpis

* /niepotrzebne skreslic



KARTA ZADAŃ PRODUKCYJNYCH FINANSOWO-RZECZOWYCH

3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---

40	41
----	----

3 pierwsze cyfry symbolu GUS
Nr województwa
wg śledziby
wykonawcy

pełna nazwa wykonawcy

81
4 2

WARTOŚĆ PRODUKCI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

przeznaczanej do wykonania w 19... r. w mln zł w przedsiębiorstwie

ogółem

42	43	44	45	46
----	----	----	----	----

roboty spoza PI

47	48	49	50
----	----	----	----

roboty z PI

51	52	53	54	55
----	----	----	----	----

planowanej na 19... r. w mln zł

symbol województwa	ogółem	z tego na		
		roboty spoza planu inwestycyj.	roboty z planu inwestycyjnego	roboty kontynuowane z planu inwestyc.

razem na terenie kraju

56	57	58	59	60
----	----	----	----	----

61	62	63	64
----	----	----	----

65	66	67	68	69
----	----	----	----	----

70	71	72	73	74
----	----	----	----	----

KA
80

82
4 2

z tego na terenie województwa 1

12	13
----	----

44	45	46	47	48
----	----	----	----	----

50	51	52	53
----	----	----	----

54	55	56	57
----	----	----	----

58	59	60	61	62
----	----	----	----	----

34	35
----	----

36	37	38	39
----	----	----	----

40	41	42	43
----	----	----	----

44	45	46	47	48
----	----	----	----	----

49	50	51	52	53
----	----	----	----	----

64	65
----	----

66	67	68	69
----	----	----	----

70	71	72	73	74
----	----	----	----	----

80

82
4 2

14	15
----	----

44	45	46	47	48
----	----	----	----	----

50	51	52	53
----	----	----	----

54	55	56	57
----	----	----	----

58	59	60	61	62
----	----	----	----	----

34	35
----	----

36	37	38	39
----	----	----	----

40	41	42	43
----	----	----	----

44	45	46	47	48
----	----	----	----	----

49	50	51	52	53
----	----	----	----	----

64	65
----	----

66	67	68	69
----	----	----	----

70	71	72	73	74
----	----	----	----	----

80

82
4 2

14	15
----	----

44	45	46	47	48
----	----	----	----	----

50	51	52	53
----	----	----	----

54	55	56	57
----	----	----	----

58	59	60	61	62
----	----	----	----	----

34	35
----	----

36	37	38	39
----	----	----	----

40	41	42	43
----	----	----	----

44	45	46	47	48
----	----	----	----	----

49	50	51	52	53
----	----	----	----	----

64	65
----	----

66	67	68	69
----	----	----	----

70	71	72	73	74
----	----	----	----	----

80

Zjednoczenie

W y k a z

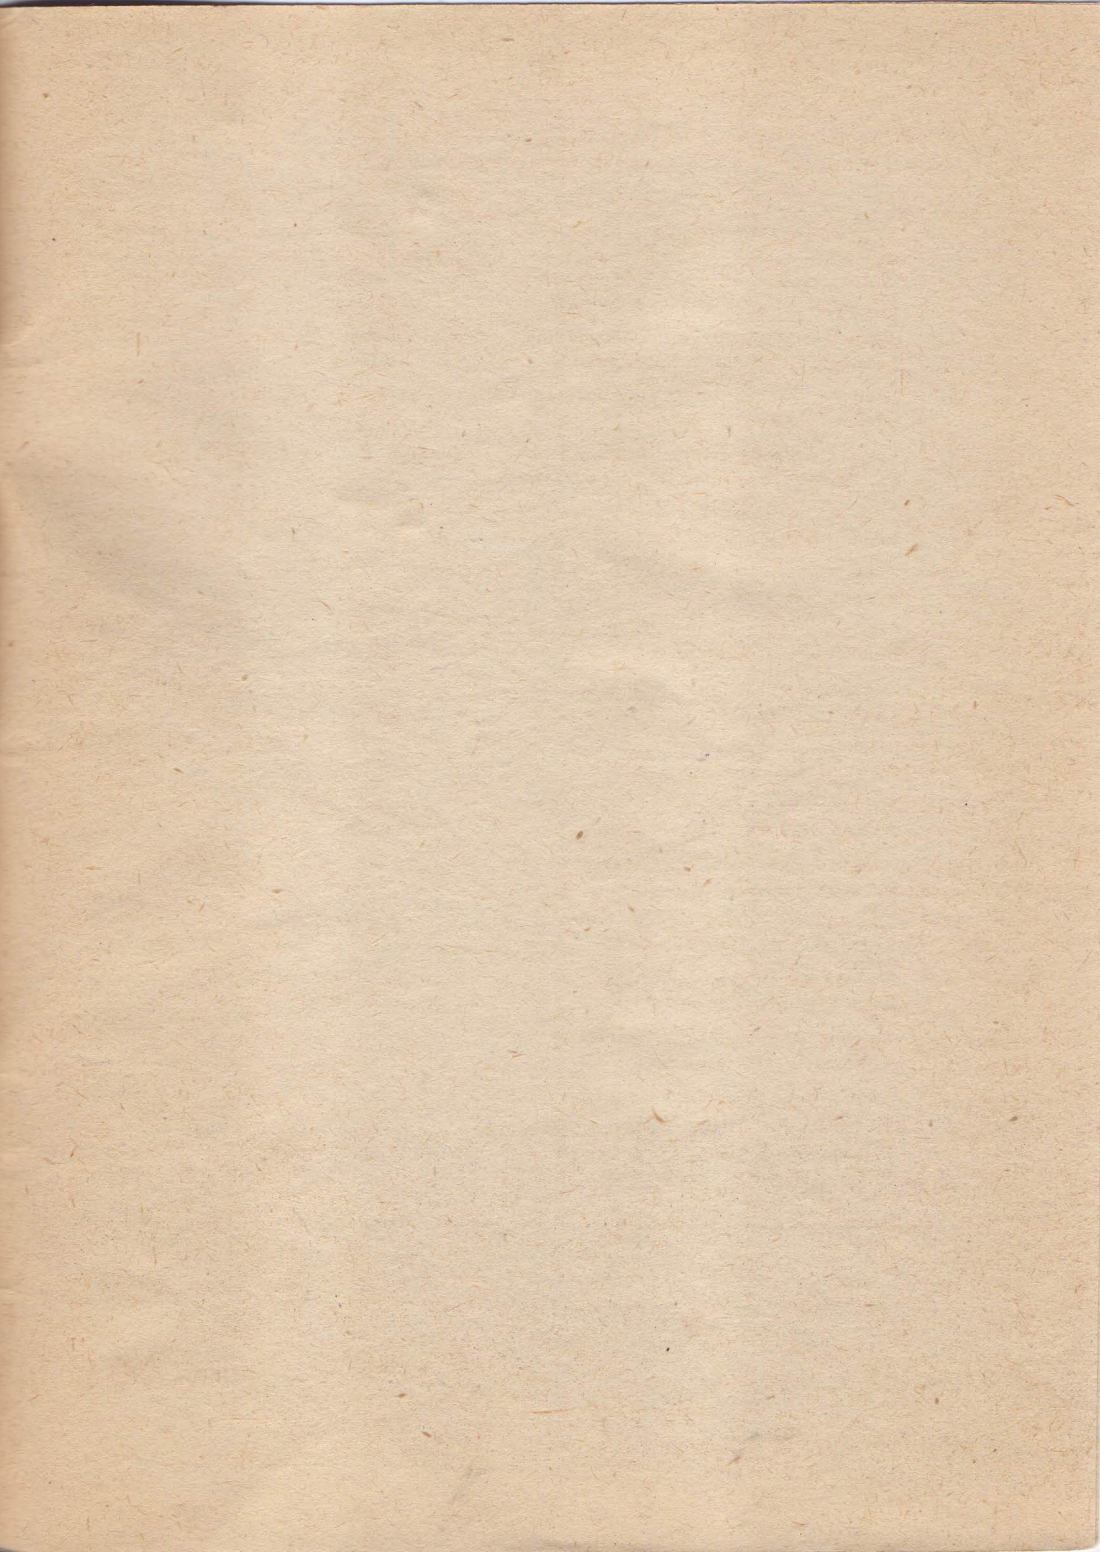
kontynuowanych /noworozpoczętych X/ zadań inwestycyjnych planu centralnego - terenowego /wniesionych do przyjęcia X/ - nieprzyjęcia X/ do wykonawstwa w 1978 r.

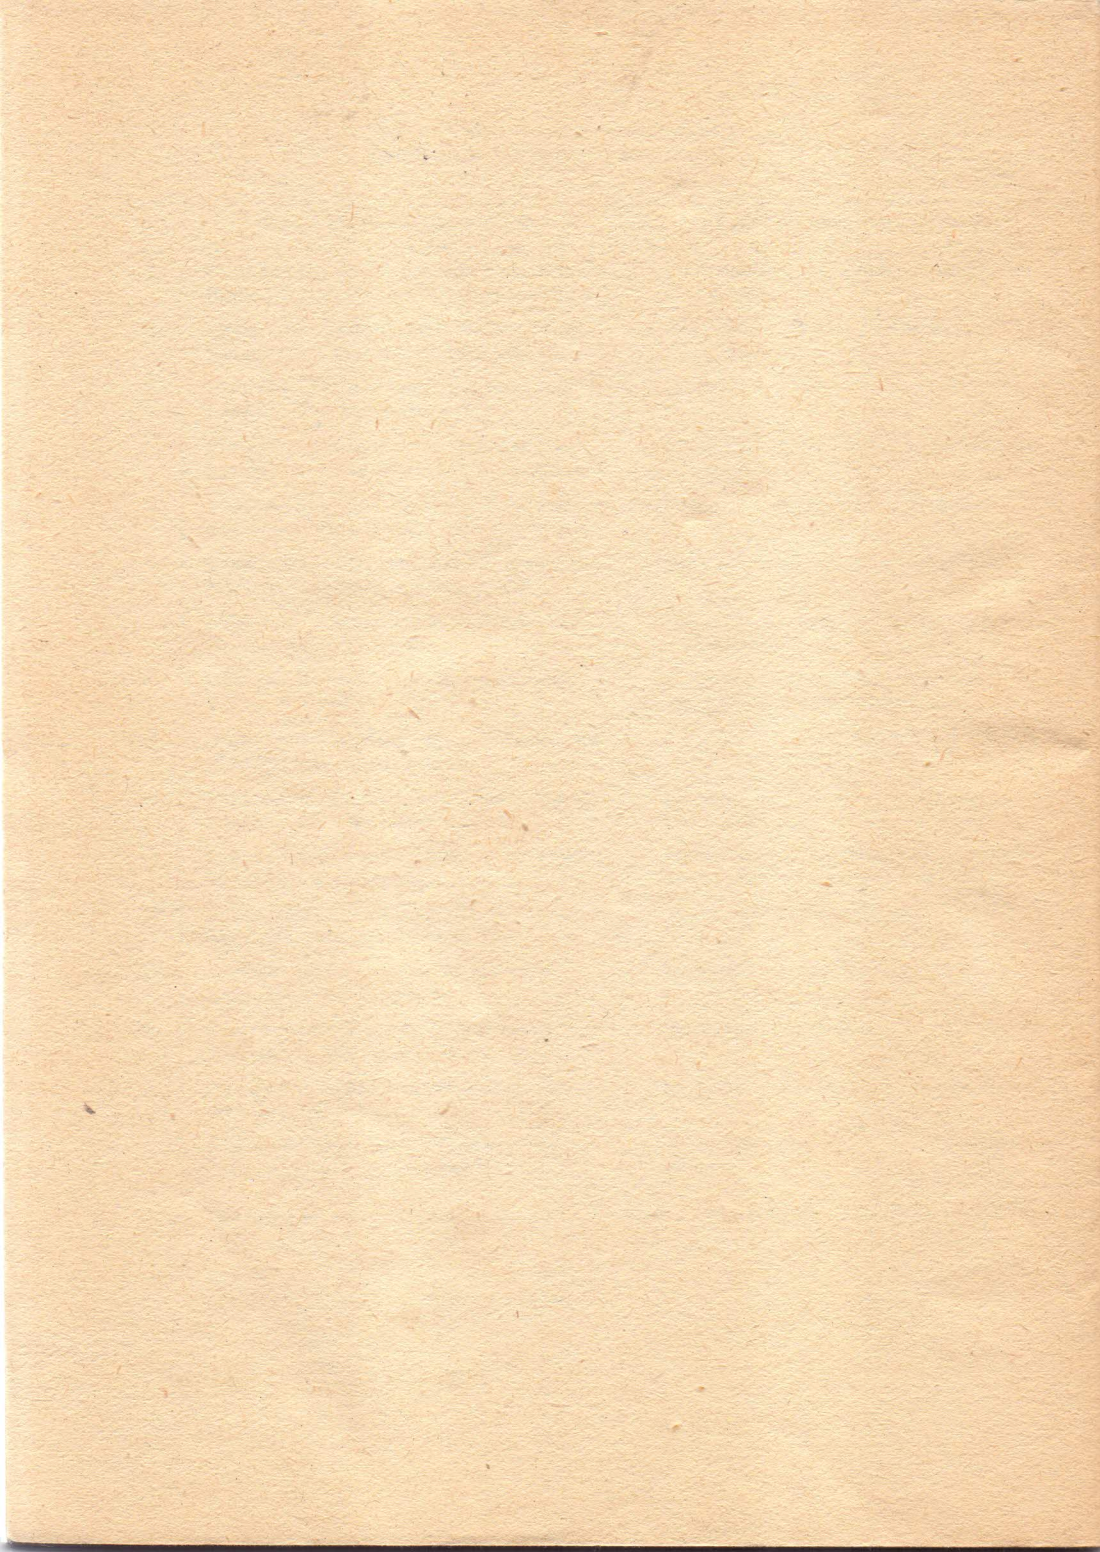
Lp	Ministerstwo /jednostka równorzędna /Urząd wojewódzki /Biuro i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość ostateczna /wzrost /robót /w mln zł	Przebieg wykonania /III, 77 r.	Wartość robót na 1978 r.		Konstrukcje stałe /loże w ilości /TOR		Termin zakończenia		Geneza /oszczędności /prace /masa	Uwagi	
				zgodna /inwestycja /tę	przebieg /zgodna /tę	niezgodna /niezgodna /tę	niezgodna /niezgodna /tę	obrotowa /niezgodna /tę	postępująca /niezgodna /tę			10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

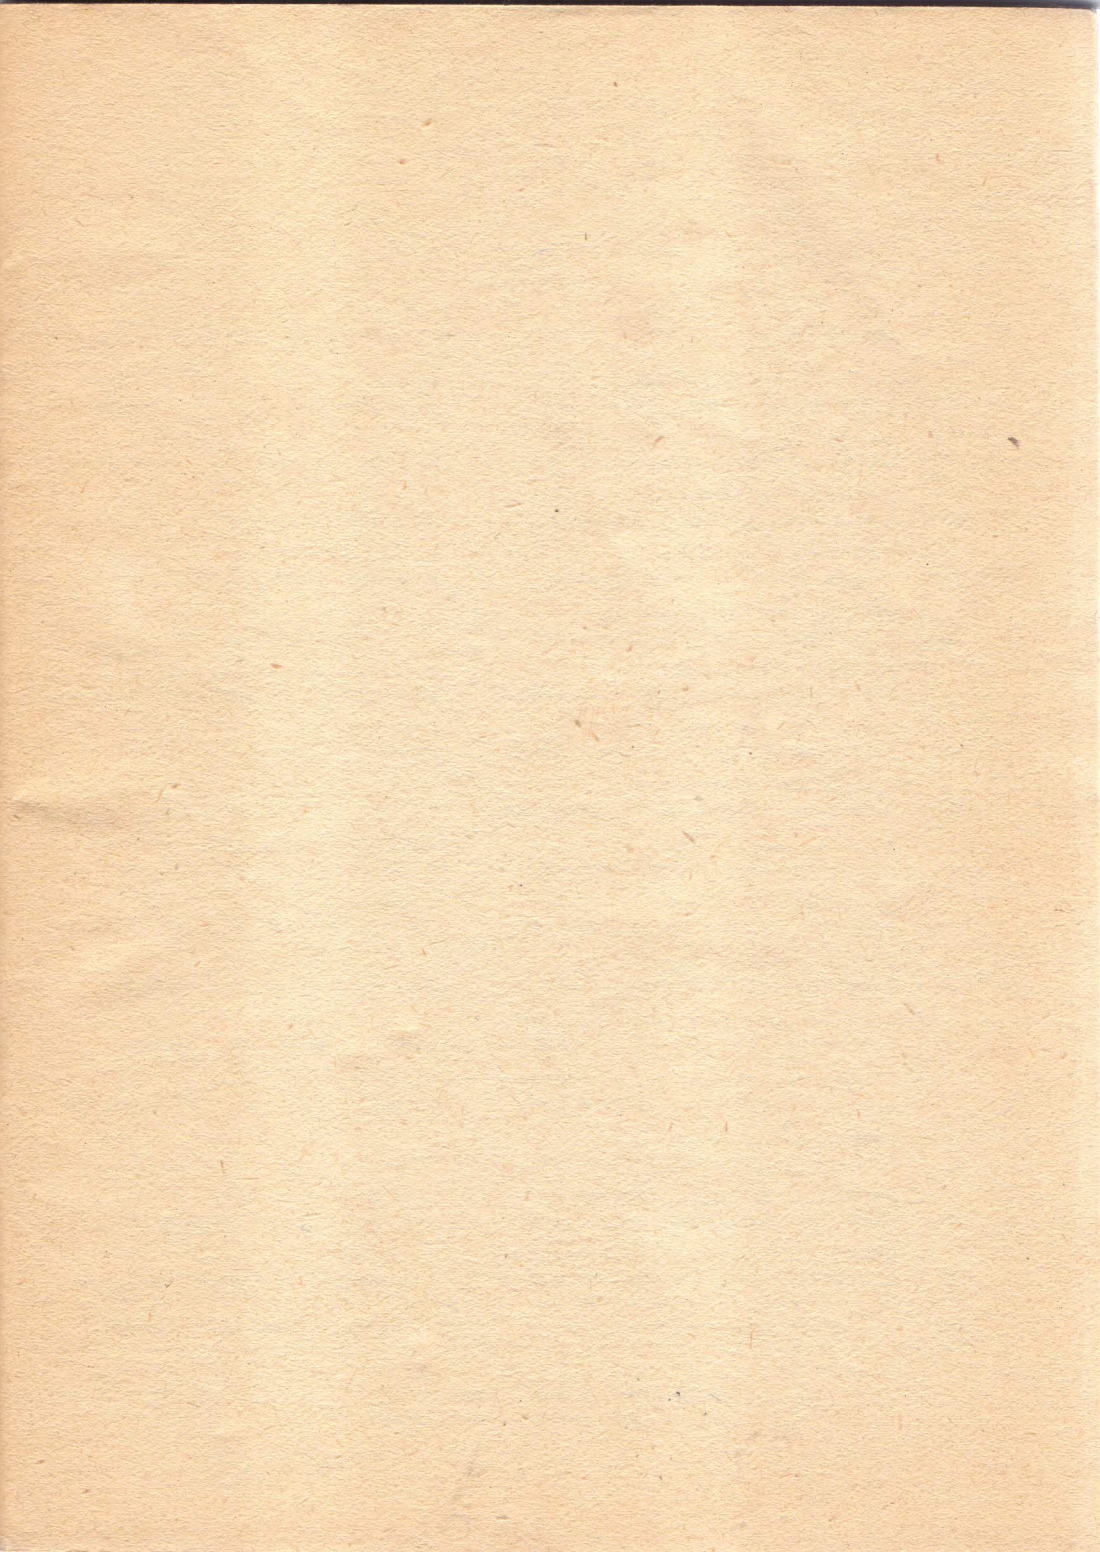
Uzasad 1/ X/ - oznaczenia niepotrzebne skreślić
 2/ inwestycje planu centralnego i planu terenowego podawane na odrębnych arkuszach.
 Na odrębnych arkuszach należy podać inwestycje proponowane do nieprzyjęcia do wykonawstwa.
 3/ Dla inwestycji proponowanych do nieprzyjęcia lub ograniczenia robót na 1978 r. należy podać szczegółowe przyczyny lub ograniczenie w tym zakresie przygotowania inwestycji do realizacji.
 dnia 197... r.
 Dyrektor

Zjednoczenia wiodące w regionalnej
koordynacji branżowej budownictwa

Lp.	Nazwa zjednoczenia i adres	Koordynowane województwa
1.	Białostockie Zjednoczenie Budownictwa Białystok, ul. M. Curie-Skłodowskiej 14	białostockie, łomżyńskie, siedleckie i suwalskie
2.	Bydgoskie Zjednoczenie Budownictwa Bydgoszcz, ul. Marcinkowskiego 7	bydgoskie, płockie, włocławskie i toruńskie
3.	Gdańskie Zjednoczenie Budownictwa Gdańsk, ul. Dyrekcyjna E	gdańskie i elbląskie
5.	Kieleckie Zjednoczenie Budownictwa Kielce, ul. Zygmunta Wróblewskiego 4	kieleckie, radomskie i tarnobrzeskie
5.	Koszalińskie Zjednoczenie Budownictwa Koszalin, Plac Bojowników PPR 6/7	koszalińskie, pilskie i słupskie
6.	Krakowskie Zjednoczenie Budownictwa Kraków, ul. Dzierżyńskiego 112	miejskie krakowskie i bielskie
7.	Lubelskie Zjednoczenie Budownictwa Lublin, ul. Próchnika 4	białskopodlaskie, chełmskie, lubelskie i zamojskie
8.	Łódzkie Zjednoczenie Budownictwa Łódź, ul. Roosevelta 15	miejskie łódzkie, piotrowskie, sieradzkie i skierniewickie
9.	Olsztyńskie Zjednoczenie Budownictwa Olsztyn, ul. Kopernika 29	olsztyńskie, ciechanowskie i ostrołęckie
10.	Poznańskie Zjednoczenie Budownictwa Poznań, ul. Ogrodowa 12	poznańskie, kaliskie, konińskie, i leszczyńskie
11.	Rzeszowskie Zjednoczenie Budownictwa Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9	rzeszowskie, krośnieńskie, przemyskie, nowosądeckie i tarnowskie
12.	Szczecińskie Zjednoczenie Budownictwa Szczecin, ul. Ogińskiego 16/17	szczecińskie i gorzowskie
13.	Śląskie Zjedn. Budown. Miejskiego Katowice, ul. Drzymały 15	katowickie i częstochowskie
14.	Zjednoczenie Budown. "Warszawa" Warszawa, ul. Jasna 22	stołeczne warszawskie
15.	Wrocławskie Zjednoczenie Budownictwa Wrocław, ul. Kuźnicza 15	opolskie, wrocławskie i wałbrzyskie
16.	Zielonogórskie Zjedn. Budownictwa Zielona Góra, ul. Chopina 11/13	jeleniogórskie, legnickie i zielono- górskie







100
